


## 様式2-2 地区の概要

弟子屈市街地地区(北海道弟子屈町) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値
○大目標 : 安全・安心に暮らせるまちづくりと観光交流拠点の再生 ・目標1 : 住民が潤いを感じ、安全、安心に暮らせるまちづくり ・目標2 : 観光交流拠点の再生により、町民と来訪者との交流空間の創出をめざす	公園・広場に対する満足度	単位: % 15.6 H21	25.0 H25	42.5 H25
	地域防災に関する満足度	単位: % 11.3 H21	20.0 H25	31.0 H25
	観光客入り込み数	単位: 人/年 861,300 H20	900,000 H25	684,000 H25
	観光交流館の来客数	単位: 人/年 111,000 H20	— H	180,000 H25

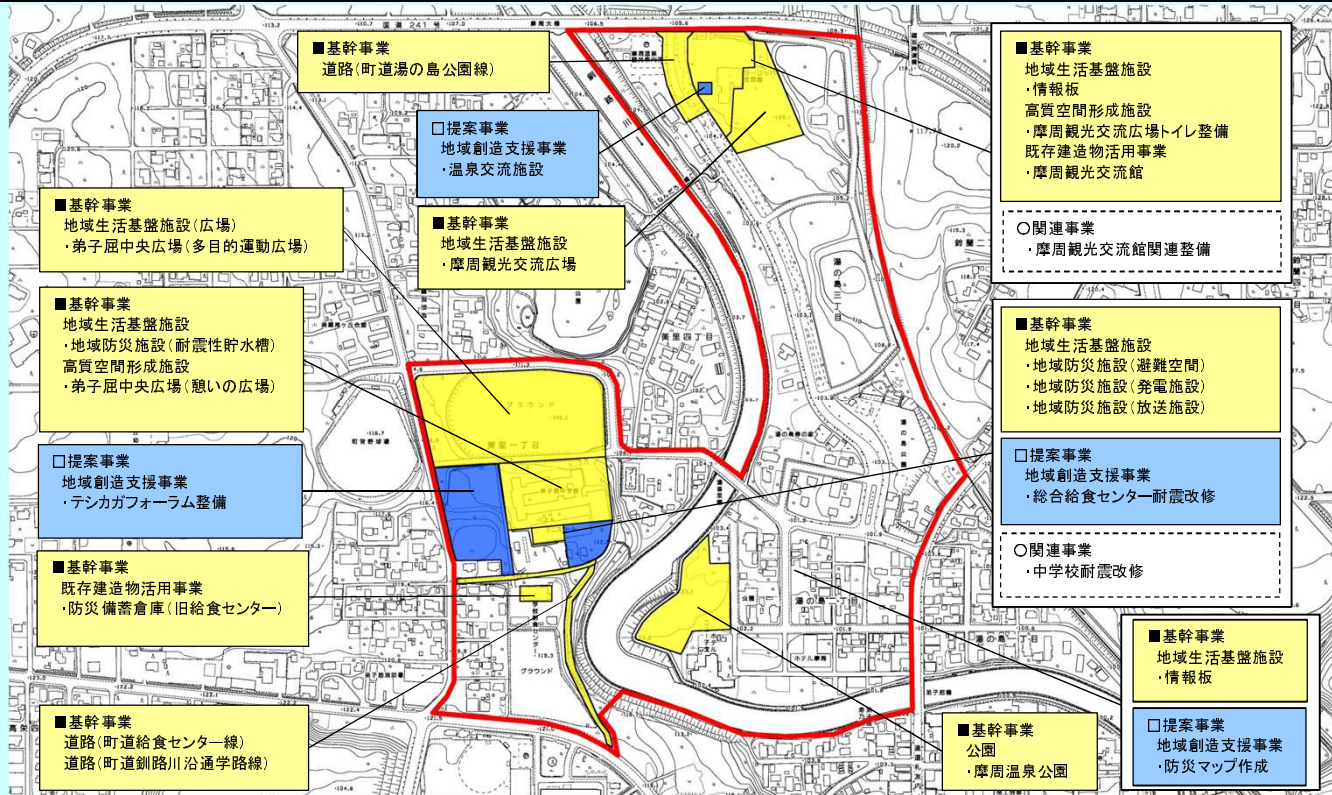

まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院跡地を公園として整備したことで、未利用地の有効活用とともに住民の憩いの場を整備することができた。</li> <li>・観光交流広場の整備により、町民と来訪者が交流できる機会が増えた。</li> <li>・地域防災拠点の整備により、住民と観光客の防災対策を進めることができた。</li> <li>・町全体の観光客入り込み数が依然減少傾向である。</li> </ul>
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本事業により施設等の基盤整備が進んだが、それらを活用するソフト事業については今後も充実を図る必要がある。</li> <li>・本事業により整備された跡地・既存建築物の活用により、町民・観光客の交流といった賑わいの創出を図る。</li> <li>・災害時に緊急避難場所として適切に機能されるよう、防災訓練等を実施していくことで、住民の防災意識の向上を図る。</li> <li>・観光交流拠点から温泉街(川湯)地区へと観光客を誘導するための方策を検討していく。</li> </ul>
