5. 集約化･撤去

■ 迂回路が存在する橋梁について、今後の利用状況や施設の必要性、利用環境の変化などを踏まえ、維持管理等で効果的である場合に集約化･撤去の検討を行います。
令和 9 年度までに 1 橋程度の集約化･撤去を検討し、将来の維持管理コストを約 1 百万円程度縮減することを目指す。

6. 対象橋梁の状態及び点検時期、修繕内容・時期

平成 26～令和元年度に実施された橋梁点検結果における橋梁健全性診断の結果をまとめた。
健全性診断別橋梁数の内訳を下表 1 に示す。

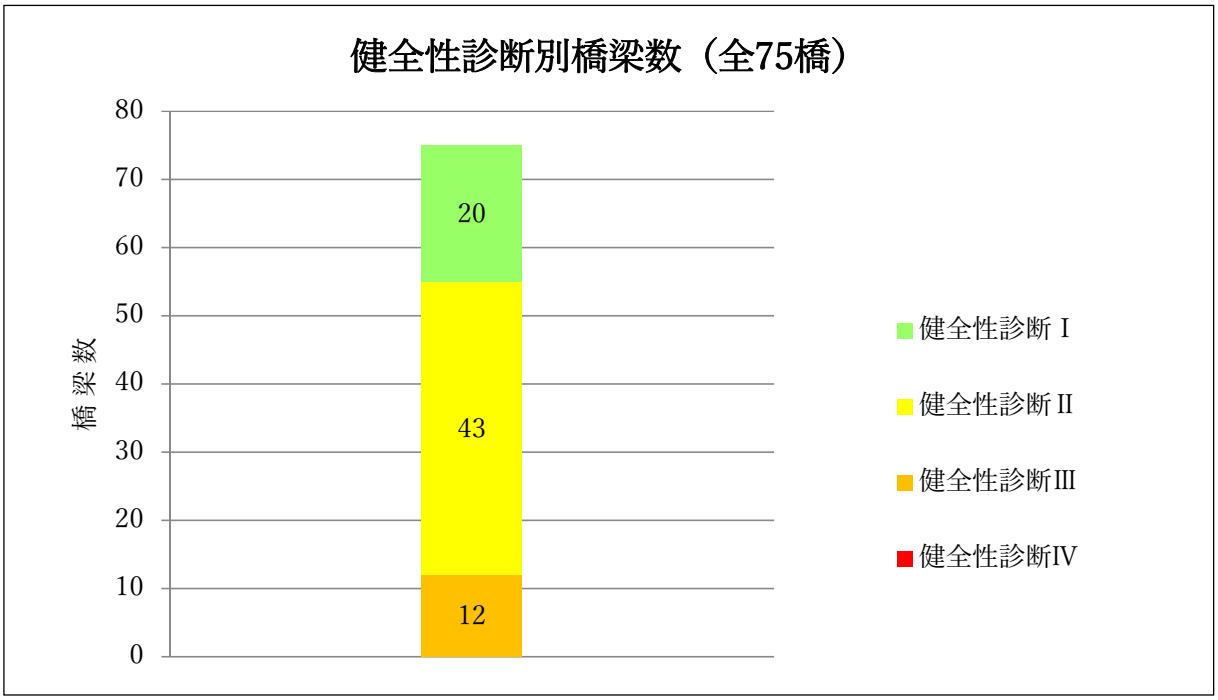


表 1 対象橋梁の状態（健全性診断結果）

※0031_美農里橋を除いて 75 橋としている。

■ 様式 1-2 による。

橋梁個別施設計画（案）10年間の修繕計画（案）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	事業費（百万円）	備考
栄橋 橋梁番号 0001	1級	弟子屈栄橋線 道路 No.0009	34.30 径間数 1	2001	25	2023	対策内容			定期点検3-5					定期点検4-5				
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費
鐺別跨道橋 橋梁番号 0002	1級	弟子屈原野43線 道路 No.0036	19.00 径間数 1	1990	36	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：A							事業費												設計委託費
下鐺別橋 橋梁番号 0003 R7補修済	1級	釧路川右岸沿線 道路 No.0036	108.40 径間数 2	1990	36	2021	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：A							事業費											14.9	設計委託費 8.5
三平古丹橋 橋梁番号 0004	1級	釧路川右岸沿線 道路 No.0036	8.80 径間数 1	1984	42	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C							事業費												設計委託費
竹内橋 橋梁番号 0005	1級	釧路川右岸沿線 道路 No.0036	16.96 径間数 1	1989	37	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費
湯の島公園橋 橋梁番号 0006	その他	湯の島水郷公園通線 道路 No.0036	4.00 径間数 1	1997	29	2023	対策内容			定期点検3-5					定期点検4-5				
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：C							事業費												設計委託費
なんだろう橋 橋梁番号 0007	その他	湯の島水郷公園通線 道路 No.0036	55.00 径間数 1	1997	29	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：A							事業費												設計委託費
泉大橋 橋梁番号 0008	1級	弟子屈小学校泉ヶ丘線 道路 No.0036	99.70 径間数 3	1983	43	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：A							事業費												設計委託費
第2更生橋 橋梁番号 0009	2級	仁多東3号線 道路 No.0036	16.30 径間数 1	1988	38	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費
第1更生橋 橋梁番号 0010	2級	仁多東3号線 道路 No.0036	21.60 径間数 1	1988	38	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費
下仁多橋 橋梁番号 0011 R5補修済	1級	下仁多南弟子屈線 道路 No.0036	12.00 径間数 2	1934	92	2025	対策内容					定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C							事業費											72.2	設計委託費 8.9
福田橋 橋梁番号 0012 R6補修済	その他	福田橋線 道路 No.0036	15.60 径間数 1	1976	50	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：B							事業費											43.0	設計委託費 11.0
上磯2号橋 橋梁番号 0013	1級	熊牛上磯分内線 道路 No.0036	19.00 径間数 1	1997	29	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費
南弟子屈橋 橋梁番号 0014	1級	南弟子屈平和線 道路 No.0036	139.9 径間数 4	1971	55	2024	対策内容			←――→ 【床版】ひびわれ注入工 【防護柵】部分補修	定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：A							事業費			40									設計委託費 12.5
熊牛第1号橋 橋梁番号 0015	その他	熊牛原野22線 道路 No.0036	8.70 径間数 1	1983	43	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C							事業費												設計委託費
山水橋 橋梁番号 0016	その他	最栄利別川沿線 道路 No.0036	16.00 径間数 1	1975	51	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費
豊隆橋 橋梁番号 0017	その他	緑染川線	16.70 径間数 1	1979	47	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費
岡田橋 橋梁番号 0018 R6設計済	1級	鐺別奥春別線	10.40 径間数 1	1970	56	2021	対策内容	←――→ 【上部工】主桁塗装塗替	定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：C							事業費	16										40.7	設計委託費 6.0
盛雲橋 橋梁番号 0019 R4補修済	1級	鐺別奥春別線	60.00 径間数 2	1972	54	2025	対策内容					定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B							事業費											29.4	設計委託費 6.1
和光橋 橋梁番号 0020	その他	最栄利別線	15.60 径間数 1	1980	46	2025	対策内容					定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B							事業費												設計委託費

橋梁個別施設計画（案）10年間の修繕計画（案）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	事業費（百万円）	備考
奥御卒別橋 橋梁番号 0021	その他	オソベツ1号線	14.9	1985	41	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
岩並橋 橋梁番号 0022	2級	奥春別小学校線	15.04	1970	56	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費												設計委託費
鐺別橋 橋梁番号 0023	1級	奥春別最栄利別線	84.4	1976	50	2025	対策内容				【支承工】支承モルタル補修、【下部工】断面修復 【伸縮】伸縮装置取替、【床版】橋面防水工 定期点検4-2						定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：B			径間数 3				事業費				40.0	70.0						128.0	設計委託費 18
最栄利別橋 橋梁番号 0024	1級	奥春別最栄利別線	20.3	1979	47	2023	対策内容			定期点検3-5					定期点検4-5				
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費												設計委託費
三好橋 橋梁番号 0025	2級	奥春別西10号三笠線	7.3	1994	32	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
美好橋 橋梁番号 0026	2級	奥春別西10号三笠線	13.3	1996	30	2023	対策内容			定期点検3-5					定期点検4-5				
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
千住橋 橋梁番号 0027	その他	奥春別川沿線	11.44	1990	36	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
三笠橋 橋梁番号 0028	2級	奥春別川沿線	15.27	1990	36	2023	対策内容			定期点検3-5					定期点検4-5				
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費												設計委託費
奥春別1号橋 橋梁番号 0029	その他	奥春別47線	12.56	2000	26	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
奥春別2号橋 橋梁番号 0030	その他	奥春別48線	12.58	2000	26	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
美農里橋 橋梁番号 0031	1種	美農里橋線	30.6	1962	64	2022	対策内容		廃橋-上部工	廃橋-下部工									
健全性判定区分：Ⅳ			径間数 1				事業費		40.0	30.0								88.7	設計委託費 18.7
札友内第1号橋 橋梁番号 0032	その他	札友内中央線	10.4	1970	56	2025	対策内容					定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
札友内第3号橋 橋梁番号 0033	その他	札友内53線	14.56	1996	30	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
札友内第4号橋 橋梁番号 0034	その他	札友内53線	14.55	1982	44	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
札友内第2号橋 橋梁番号 0035	1級	札友内楽農線	11.4	1985	41	2023	対策内容			定期点検3-5					定期点検4-5				
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
札友内第5号橋 橋梁番号 0036	1級	札友内楽農線	11.8	1984	42	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
勝美橋 橋梁番号 0037	その他	美留和西2号線	14.6	1983	43	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
天籟橋 橋梁番号 0038	2級	美留和西2号線	17.2	1981	45	2024	対策内容			【上部工】主桁塗装塗替、支障モルタル補修 定期点検4-1						定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費			18.0								23.0	設計委託費 5.3
天佑橋 橋梁番号 0039	2級	美留和西2号線	11.1	1982	44	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費

橋梁個別施設計画（案）10年間の修繕計画（案）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	事業費（百万円）	備考
美豊橋 橋梁番号 0040 2級 健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B		美留和西2号線	18.3 径間数 1	1986	40	2024	対策内容 事業費				定期点検4-1					定期点検5-1			設計委託費
千歳橋 橋梁番号 0041 R7設計済 健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：C	2級	美留和古丹線	13.5 径間数 1	1972	54	2024	対策内容 事業費	【上部工】主桁塗替 【下部工】断面修復工 32			定期点検4-1					定期点検5-1		42.4	設計委託費 10.7
石狩別橋 橋梁番号 0042 2級 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C		美留和古丹線	11.54 径間数 1	1997	29	2025	対策内容 事業費					定期点検4-2					定期点検5-2		設計委託費
豊栄橋 橋梁番号 0043 2級 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B		美留和石狩別線	17.7 径間数 1	1985	41	2024	対策内容 事業費				定期点検4-1					定期点検5-1			設計委託費
美里橋 橋梁番号 0044 2級 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C		美留和石狩別線	13.5 径間数 1	1983	43	2024	対策内容 事業費				定期点検4-1					定期点検5-1			設計委託費
美留和橋 橋梁番号 0045 R7設計済 健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：A	1級	美留和札友内線	40 径間数 1	1967	59	2025	対策内容 事業費		【上部工】主桁塗装塗替、支承モルタル補修 30.0			定期点検4-2					定期点検5-2	39.0	設計委託費 9.0
美登里橋 橋梁番号 0046 R6補修済 健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：A	2級	美登里橋線	40 径間数 2	1968	58	2025	対策内容 事業費					定期点検4-2					定期点検5-2	56.1	設計委託費 9.9
豊年橋 橋梁番号 0047 2級 健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：B		屈斜路丸山ウランコシ線	30 径間数 1	1975	51	2025	対策内容 事業費				【支承】塗装塗替、支承モルタル補修 【伸縮】伸縮装置取替 28.0	定期点検4-2					定期点検5-2	34.5	設計委託費 6.5
万作橋 橋梁番号 0048 2級 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B		屈斜路丸山ウランコシ線	20 径間数 1	1979	47	2021	対策内容 事業費	定期点検3-3					定期点検4-3						設計委託費
美湖視橋 橋梁番号 0049 2級 健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B		屈斜路湖畔線	30 径間数 1	1970	56	2024	対策内容 事業費				定期点検4-1					定期点検5-1			設計委託費
美香橋 橋梁番号 0050 その他 健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：B		和琴半島屈斜路湖畔線	41 径間数 2	1984	42	2025	対策内容 事業費			【支承】支承モルタル補修 【伸縮】伸縮装置取替 22.0		定期点検4-2					定期点検5-2	31.0	設計委託費 9
丸山橋 橋梁番号 0051 その他 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C		屈斜路秋栄6号線	11.54 径間数 1	1999	27	2025	対策内容 事業費					定期点検4-2					定期点検5-2		設計委託費
敷島橋 橋梁番号 0052 1級 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C		川湯本通敷島線	11.7 径間数 1	2005	21	2022	対策内容 事業費		定期点検3-4					定期点検4-4					設計委託費
万吉橋 橋梁番号 0053 2級 健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C		川湯朝霧橋線	8.4 径間数 1	1978	48	2021	対策内容 事業費	定期点検3-3					定期点検4-3						設計委託費
朝霧橋 橋梁番号 0054 R6設計済 健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：C	2級	川湯朝霧橋線	8.4 径間数 1	1978	48	2021	対策内容 事業費	【橋梁護岸】護岸補修 12	定期点検3-4					定期点検4-4				40.0	設計委託費 10.1
敷島つつじ橋 橋梁番号 0055 その他 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C		川湯2丁目線	11.6 径間数 1	2004	22	2022	対策内容 事業費		定期点検3-4					定期点検4-4					設計委託費
敷島みどり橋 橋梁番号 0056 その他 健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C		川湯敷島線	11.6 径間数 1	2003	23	2022	対策内容 事業費		定期点検3-4					定期点検4-4					設計委託費
緑1号橋 橋梁番号 0057 2級 健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C		川湯敷島緑線	12.3 径間数 1	1978	48	2021	対策内容 事業費	定期点検3-3					定期点検4-3						設計委託費
緑2号橋 橋梁番号 0058 R5補修済 健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：B	2級	川湯敷島緑線	21 径間数 1	1979	47	2021	対策内容 事業費	定期点検3-3					定期点検4-3					37.3	設計委託費 6.2

橋梁個別施設計画（案）10年間の修繕計画（案）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	事業費（百万円）	備考
緑3号橋 橋梁番号 0059	2級	川湯敷島緑線	14.5	1980	46	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
秀月橋 橋梁番号 0060	その他	跡佐登66線	15.5	1995	31	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費												設計委託費
跡佐橋 橋梁番号 0061	その他	跡佐登67線	9.4	1979	47	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
野上橋 橋梁番号 0062	その他	跡佐登67線	16.26	1990	36	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費												設計委託費
豊橋 橋梁番号 0063	2級	跡佐登68線	12	1978	48	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
清水橋 橋梁番号 0064	その他	跡佐登68線	15.6	1982	44	2025	対策内容			【上部工】断面修復 【下部工】補修		定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費			13.0									設計委託費 12
奥春別小学校線1号函渠 橋梁番号 0065	2級	奥春別小学校線	2.3	1986	40	2022	対策内容		定期点検3-4					定期点検4-4					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
奥春別1号明渠1号函渠 橋梁番号 0066	2級	奥春別小学校線	2.33	1999	27	2025	対策内容					定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
奥春別西13号線1号函渠 橋梁番号 0067	その他	奥春別西13号線	4.8	1998	28	2025	対策内容					定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
拓北幹線明渠49線函渠 橋梁番号 0068	その他	弟子屈原野49線	3.4	1983	43	2025	対策内容					定期点検4-2					定期点検5-2		
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
美留和1号幹線12号函渠 橋梁番号 0069	2級	美留和西2号線	3.5	1986	40	2024	対策内容				定期点検4-1					定期点検5-1			
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
川湯本通敷島線1号函渠 橋梁番号 0070	1級	川湯本通敷島線	2.4	1970	56	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
川湯本通敷島線2号函渠 橋梁番号 0071	1級	川湯本通敷島線	2.35	1970	56	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
川湯2丁目線1号函渠 橋梁番号 0072	その他	川湯2丁目線	5.8	1976	50	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：C			径間数 2				事業費												設計委託費
跡佐登3号明渠11号函渠 橋梁番号 0073	1級	跡佐登摩周口線	2.5	1979	47	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
跡佐登3号明渠9号函渠 橋梁番号 0074	2級	跡佐登東12号線	3	1979	47	2021	対策内容	定期点検3-3					定期点検4-3						
健全性判定区分：Ⅰ 維持管理区分：C			径間数 1				事業費												設計委託費
弟子屈橋 橋梁番号 0075	その他	中央美里線	31.6	1981	45	2023	対策内容	【上部工】橋面防水、舗装打換工	【上部工】主桁塗装塗替、支承モルタル補修、伸縮装置取替 【下部工】ひび割れ補修・断面修復工	定期点検3-5				定期点検4-5					
健全性判定区分：Ⅲ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費	27	90.0									130.4	設計委託費 12.4
湯香里橋 橋梁番号 0076	その他	中央美里線	31.53	1976	50	2023	対策内容			定期点検3-5				定期点検4-5					
健全性判定区分：Ⅱ 維持管理区分：B			径間数 1				事業費												設計委託費
